PROJECT : AABB	ระยะเวลา	100 วัน
OWNER : KHUN DECEMBER	เริ่มตั้งแต่	
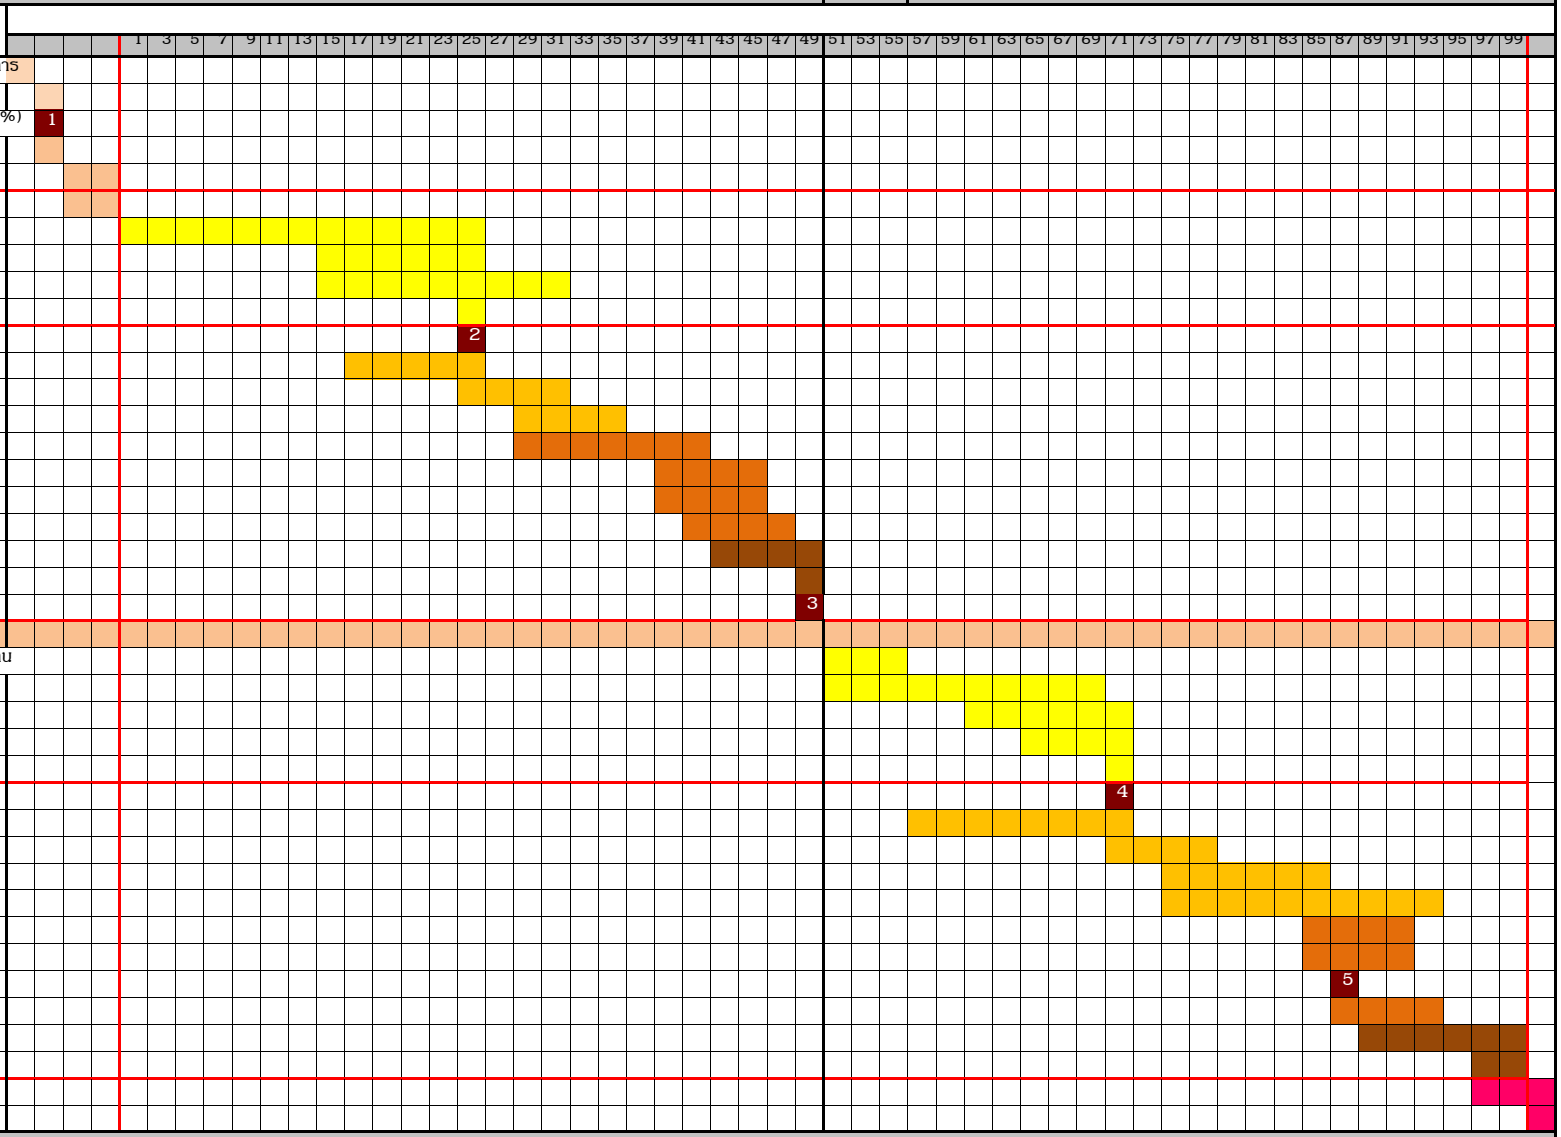
No.	Description
1	นำเสนอ PROPOSAL และ SCHEDULE รวม พร้อมลงนามเพื่อดำเนินการ
2	สรุปรายละเอียดของงานออกแบบ พร้อมสรุปวัสดุที่ใช้
3	นำเสนอราคาพร้อมลงนามสัญญากอสราง เบิก**งวดที่ 1.**(จำนวน 20%)
4	ดำเนินการขออนุญาติเข้าตกแต่งกับทางอาคาร
5	นำเสนอแผนการผลิตโดยละเอียด พร้อมเริ่มดำเนินการ
6	งานจัดซื้อวัสดุสำหรับงานตกแต่งเข้าโรงงาน
7	งานเริ่มต้นประกอบงานโครงสร้างเฟอร์นิเจอร์ที่โรงงาน
8	งานเริ่มประกอบหน้าบานเฟอร์นิเจอร์ ที่โรงงาน
9	งานเริ่มต้นทำปิดผิวลามิเนตและทำสีพ่นอุตสาหกรรม ที่โรงงาน
10	งานเริ่มขนย้าย เฟอร์นิเจอร์BUILT-INเข้าหน้างาน
11	ตรวจเชคงานครังที่ 2. เบิก**งวดที่ 2.** (จำนวน 20%)
12	งานติดตังงานผนังตกแต่งผนังไม้ที่หน้างาน
13	ติดตังเฟอร์นิเจอรBUILT-Inที่หน้างานชั้น 2 เข้าตามตำแหน่ง
14	ติดตังเฟอร์นิเจอรBUILT-Inที่หน้างานชั้น 1 เข้าตามตำแหน่ง
15	งานทำสีเฟอร์นิเจอร์BUILT-Inพร้อมผนังตกแต่งที่หน้างาน
16	งานติดตังบัวพืนและงานประตู
17	งานติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าดวงโคม สวิตช์และปลัก
18	งานติดตังเสเตนเลส ผนังหุ้มผ้าบุ กระจก มือจับ และหิน
19	งานเก็บสีน้ำอะคริลิคที่ฝ้าและผนัง
20	ทำความสะอาด (ส่งตรวจงานบ้านหลังใหม่.)
21	ตรวจเชคงานครังที่ 3. เบิก**งวดที่ 3.** (จำนวน 25%)
	ขนย้ายและจัดเตรียมสถานที่บ้านหลังใหม่ 15 วัน
22	งานรือถอนเฟอร์นิเจอร์เดิมและจัดซื้อวัสดุสำหรับงานตกแต่งเข้าโรงงาน
23	งานเริ่มต้นประกอบงานโครงสร้างเฟอร์นิเจอร์ที่โรงงาน
24	งานเริ่มประกอบหน้าบานเฟอร์นิเจอร์ ที่โรงงาน
25	งานเริ่มต้นปิดผิวลามิเนตและทำสีพ่นอุตสาหกรรม ที่โรงงาน
26	งานเริ่มขนย้าย เฟอร์นิเจอร์BUILT-INเข้าหน้างาน
27	ตรวจเชคงานครังที่ 4. เบิก**งวดที่ 4.** (จำนวน 25%)
28	งานติดตังงานผนังตกแต่งผนังไม้ที่หน้างาน
29	ติดตังเฟอร์นิเจอรBUILT-Inที่หน้างานชั้น 2 เข้าตามตำแหน่ง
30	ติดตังเฟอร์นิเจอรBUILT-Inที่หน้างานชั้น 1 เข้าตามตำแหน่ง
31	งานทำสีเฟอร์นิเจอร์BUILT-Inพร้อมผนังตกแต่งที่หน้างาน
32	งานติดตังบัวพืนและงานประตู
33	งานติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าดวงโคม สวิตช์และปลัก
34	ตรวจเชคงานครังที่ 5. เบิก**งวดที่ 5.** (จำนวน 10%)
35	งานติดตังกระจก มือจับ และหิน
36	งานเก็บสีน้ำอะคริลิคที่ฝ้าและผนัง
37	ทำความสะอาด (ส่งตรวจงานบ้านหลังเก่า.)
38	แก้ไขงานตามรายการพร้อมส่งมอบหน้างาน
39	ส่งมอบงาน./เบิก**งวดที่ 6.** (จำนวน 10%)
